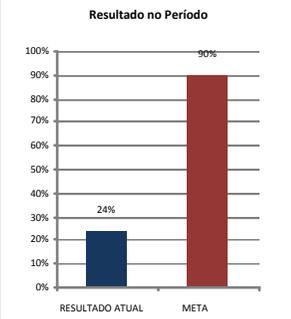
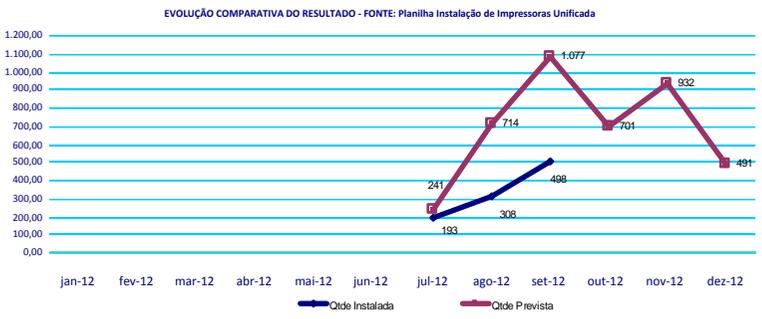


 PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIGAR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			x	INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Infraestrutura e tecnologia					OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir a infraestrutura às atividades administrativas e judiciais.				
INDICADOR	Percentual de impressoras instaladas					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Atualização do Parque Tecnológico e Acréscimos: Impressoras				
FINALIDADE	Acompanhamento da evolução do projeto quanto à quantidade de impressoras instaladas										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado
PERIODICIDADE	x	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	$(\sum \text{Qtde instalada} \text{ mês} / \sum \text{Qtde prevista}) * 100$										SENTIDO DE MELHORIA		MM
META	90 % da quantidade prevista até dez/12							ORIGEM DOS DADOS			UNIDADE DE MEDIDA		UND
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012												
	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	Resultado no Per
	Qtde Instalada						193	308	498				999
	Qtde Prevista						241	714	1.077	701	932	491	4.156
% atendido						80%	43%	46%	0%	0%	0%	24%	
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	-												
RESULTADO ATUAL	24%												
META	90%												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Percentuais de instalação abaixo do previsto, em virtude do atraso na entrega dos cartuchos das impressoras multifuncionais, não entregues na data prevista pela empresa AMC, justificado pela operação realizada pela Polícia Federal (Maré Vermelha). Cumprimento do cronograma comprometido também pela utilização de técnicos nas instalações de equipamentos para implementação do processo eletrônico, novas unidades organizacionais e mudanças. Cabe salientar que o cronograma de impressoras, com a anuência do DEPD, foi elaborado com base na expectativa de novo contrato de prestação de serviços, o que não ocorreu até o presente. A empresa contratada faria a alocação de recursos adequada para o cumprimento do cronograma.</p> <p>Não será possível cumprir o cronograma no prazo previsto.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardando novo contrato de prestação de serviços.												
Responsável pela emissão do relatório: Abel Diniz de Almeida Silva					Responsável (aprovação e divulgação): Abel Diniz de Almeida Silva					Data: 26/10/2012			
