
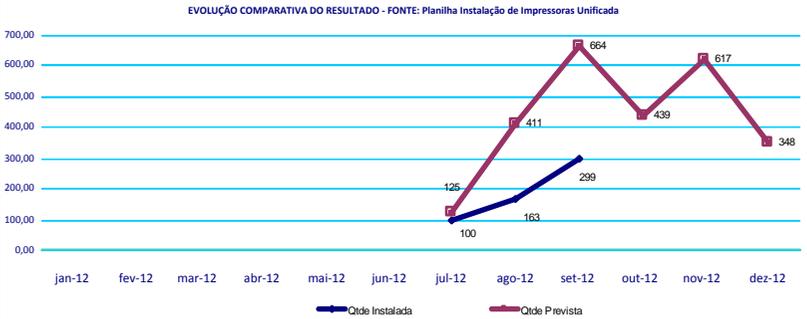


 PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da Internet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DIGAR	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Infraestrutura e tecnologia			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a infraestrutura às atividades administrativas e judiciais.									
INDICADOR	Percentual de locais atendidos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Atualização do Parque Tecnológico e Acréscimos: Impressoras									
FINALIDADE	Acompanhamento da evolução do projeto quanto à quantidade de locais atendidos.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	x	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	$(\sum \text{Qtde instalada} \text{ mês} / \sum \text{Qtde prevista}) * 100$										SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	90 % da quantidade prevista até dez/12					ORIGEM DOS DADOS	Instalação de Impressoras Unificadas.xls		UNIDADE DE MEDIDA	UND				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	Resultado no Per
	Qtde Instalada							100	163	299				562
	Qtde Prevista							125	411	664	439	617	348	2.604
	% atendido							80%	40%	45%	0%	0%	0%	22%
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	-													
RESULTADO ATUAL	22%													
META	90%													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Percentuais de instalação abaixo do previsto, em virtude do atraso na entrega dos cartuchos das impressoras multifuncionais, não entregues na data prevista pela empresa AMC, justificado pela operação realizada pela Polícia Federal (Maré Vermelha). Cumprimento do cronograma comprometido também pela utilização de técnicos nas instalações de equipamentos para implementação do processo eletrônico, novas unidades organizacionais e mudanças. Cabe salientar que o cronograma de impressoras, com a anuência do DEPD, foi elaborado com base na expectativa de novo contrato de prestação de serviços, o que não ocorreu até o presente. A empresa contratada faria a alocação de recursos adequada para o cumprimento do cronograma.</p> <p>Não será possível cumprir o cronograma no prazo previsto.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Aguardando novo contrato de prestação de serviços.													
Responsável pela emissão do relatório: Abel Diniz de Almeida Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Abel Diniz de Almeida Silva				Data: 29/10/2012						
