




Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação- DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

*DGTEC - EsPro*

# Portfólio de Projetos 2020

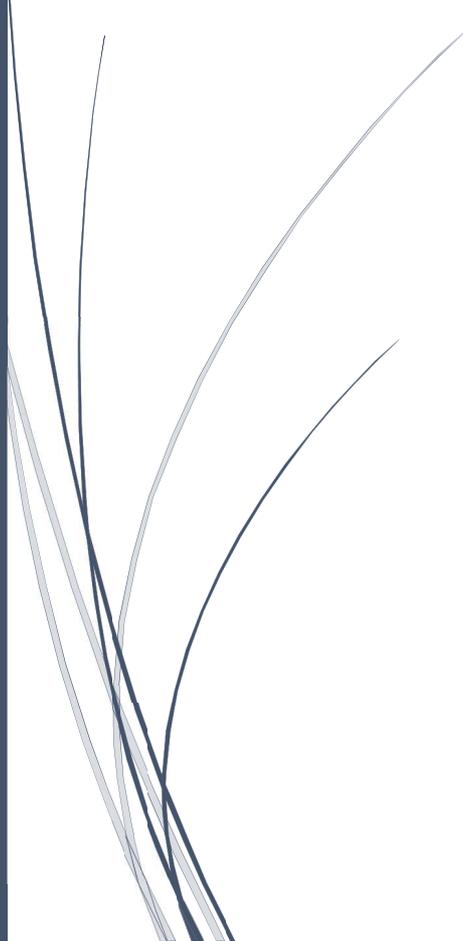



## Sumário

<b>1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Distribuição dos projetos por classe.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Distribuição dos projetos por departamento.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Situação atual dos projetos do DESIS.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Situação atual dos projetos do DEATE.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Situação atual dos projetos do ASGOV.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Situação atual dos projetos do DEINF.....</b>	<b>11</b>
<b>8. Situação atual dos projetos do DEINT.....</b>	<b>11</b>



## 1. Portfólio de projetos acompanhados pelo EsPro

N. do Projeto	Nome do Projeto	Classificação do Projeto	Status	Gerente de Projetos	Início	Encerramento
30220	Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI	<b>Prioritário</b>	Planejamento	Danusa Coelho	Jan/15	TBD
30229	Substituição do SHS pelo SCOLWEB	<b>Prioritário</b>	Execução	Cleiver Carvalhal	Ago/15	Ab/21
30260	Ampliação do Processo Eletrônico Judicial	<b>Estratégico</b>	Encerramento	Maria Eugenia Borges	Jun/15	Jul/20
30280	Implementação do novo sistema GPES	<b>Prioritário</b>	Execução	Victor Alencar	Jun/15	TBD
30281	Aquisição de Sistema de Gestão de Saúde	<b>Prioritário</b>	Planejamento	Aline Viana Magalhães	Jun/15	TBD
30369	Reformulação do Visualizador do PJERJ	<b>Prioritário</b>	Execução	Marcos Monteiro	Jul/15	Ago/20
30399	Webservice PGM - DARM Compartilhado Banco do Brasil	<b>Prioritário</b>	Execução	Claudio da Costa Blanco	Jul/15	TBD
31033	Migração dos sistemas MUMPS da DIADD	<b>Prioritário</b>	Execução	Aline Viana Magalhães	Fev/16	TBD
31034	Migração dos sistemas MUMPS do SEHAC	<b>Prioritário</b>	Execução	Flávio Vazquez	Fev/16	TBD
31657	Custas GRERJ & SMR	<b>Prioritário</b>	Homologação	Claudio da Costa Blanco	Fev/17	TBD
31658	Custas no DCP	<b>Prioritário</b>	Homologação	Claudio da Costa Blanco	Fev/17	TBD
31839	Fluxo dos Juizados Fazendários	<b>Prioritário</b>	Encerramento	Maria Eugênia Borges	Ago/17	Mai/20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação- DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro


31864	PIE CR- Petição Eletrônica no CR	Prioritário	Implantação	Marcelo Barroso Bernabé	Ago/17	TDB
31880	Atualização do Parque Tecnológico (continuação)	Estratégico	Execução	Abel Diniz Silva	Set/17	Dez/20
31923	Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis	Prioritário	Planejamento	Paulo Henrique A da Silva	Ago/17	TBD
31924	E- Social	Prioritário	Execução	Victor de Alencar Jesus	Fev/17	Jul/22
32047	GabineteWeb	Prioritário	Implantação	Natalie Mussi	Nov/17	TBD
32073	APP dos Advogados/Partes	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	Out/2017	TBD
32163	Plantão Judicial Eletrônico	Prioritário	Encerramento	Maria Eugênia Borges	Ago/18	Mai/20
32323	Fluxo JEC – 2ª Fase	Prioritário	Encerramento	Maria Eugênia Borges	Fev/18	Mai/20
32328	Novo Portal Advogados/Partes	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	Ago/18	TBD
32330	Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE	Prioritário	Homologação	Marcelo Barroso Bernabé	Set/18	TBD
32372	Super Sigilo Proc.2017.0213836	Prioritário	Execução	Claudio A Felix Pinto	Dez/18	TBD
32402	Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE	Estratégico	Implantação	André Gurgel	Nov/18	Dez/22
32403	Novo Sistema de Cobrança	Prioritário	Execução	Claudio da Costa Blanco	Dez/18	TBD



Relatório Mensal de Acompanhamento do Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação- DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

32404	Sistema GRP-THEMA da DGPCF	<b>Prioritário</b>	Homologação	Rodrigo Meireles	Dez/2018	JUL/21
32405	Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI	<b>Estratégico</b>	Encerramento	Virna Amorim	Set/18	JUL/20
32406	Migração do Projudi para o sistema SEEU	<b>Prioritário</b>	Encerramento	Simone Araujo	Jan/19	Jun/20
32407	Novo Sistema de Controle de Usuários aos Sistemas Corporativos	<b>Estratégico</b>	Planejamento	Ivan Lindenberg Jr	Jan/19	TBD
32408	Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC	<b>Estratégico</b>	Planejamento	Renato Warwar	Jan/19	Dez/20
32492	Automação Dashboard Governança	<b>Prioritário</b>	Planejamento	Marcelo Barroso Bernabé	Jan/19	TBD
32644	Portal da Aprendizagem	<b>Prioritário</b>	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	Jun/19	TBD
32762	Portal do Conhecimento – 2ª Fase	<b>Prioritário</b>	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	Ago/19	TBD
32800	DevOps	<b>Prioritário</b>	Homologação	Marcelo Barroso Bernabé	Ago/19	TBD
32822	App do GabineteWeb	<b>Prioritário</b>	Implantação	Natalie Mussi	Jan/19	TBD
32891	Novo Sistema EMERJ	<b>Prioritário</b>	Encerrado	Rodrigo Meireles/Carlos André S Santos	Dez/17	Dez/20
32892	Automatização das Portarias de Custas	<b>Prioritário</b>	Execução	Claudio da Costa Blanco	Jan/20	Dez/20
32893	Migração DATAVIX – VISADOC	<b>Prioritário</b>	Encerrado	Victor de Alencar Jesus	Jan/20	Jul/20

## 2. Distribuição dos projetos por classe

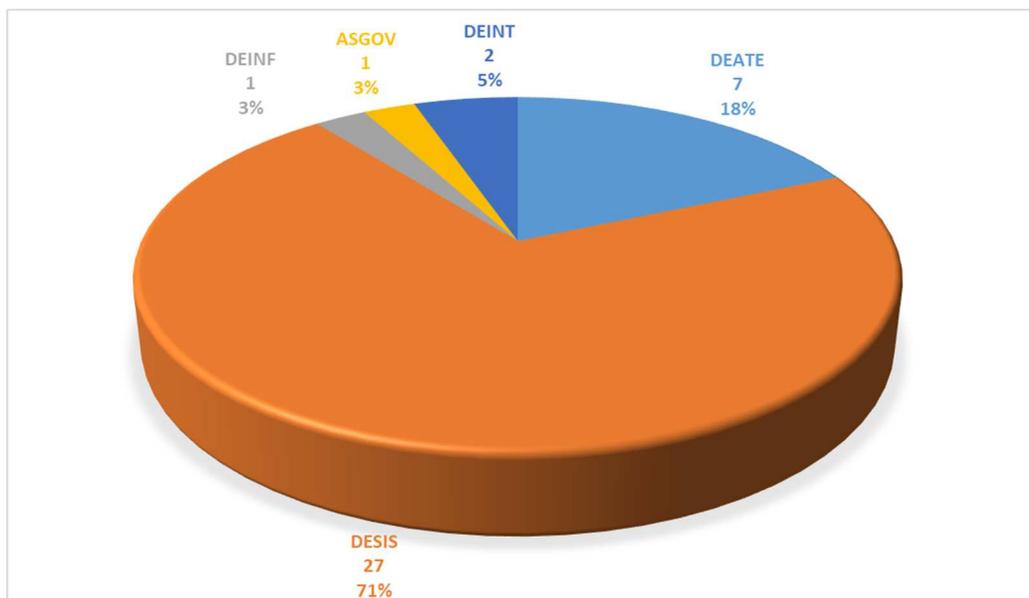


### Legenda

**Estratégico (PE):** É aquele que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do Pjerj e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução.

**Prioritários (PP):** É aquele que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pelo CGTIC e pelo diretor da DGTEC.

## 3. Distribuição dos projetos por departamento

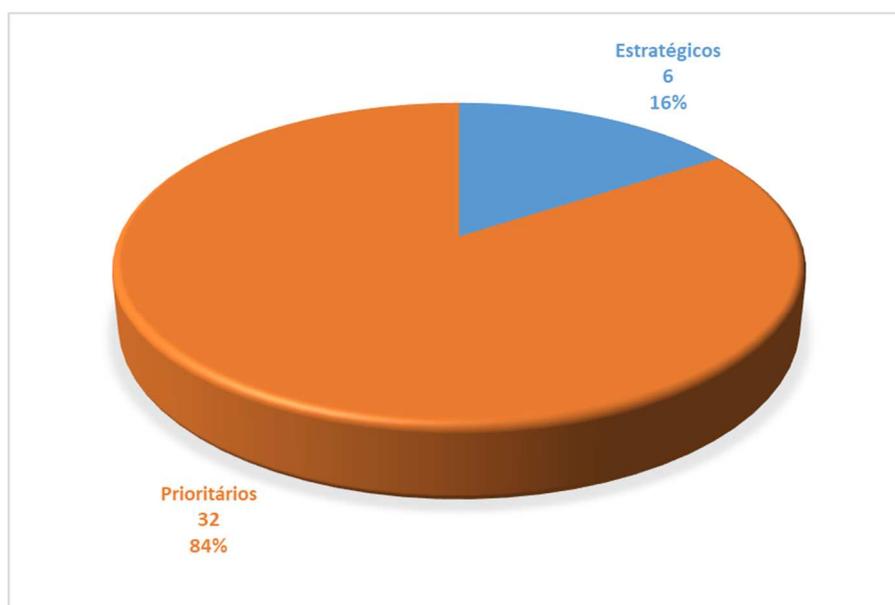



## 4.Situação atual dos projetos do DESIS

PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI: Sem alteração do status. A execução da PoC (2020-0603018) com a ferramenta Microsoft Power BI pela Presidência do TJERJ e continuidade do planejamento da PoC com a ferramenta Tableau, com a verificação da infraestrutura necessária para realização desta PoC ainda em continuidade. O processo administrativo (2020-0606260) que trata da aquisição da Ferramenta de BI está em fase inicial de planejamento, com publicação em 19/03/2020 no DJE informando a equipe de Planejamento de TI responsável pela continuidade do projeto. Realizamos a Prova de Conceito (PoC) com a ferramenta Tableau nos dias 08, 09, 10 e 11/setembro.

\*

PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL: Atividades implantadas: Mapeamento das globais do SHS e PROT; Migração da tabela de tipos de serventia; Cadastro de tipo de classificação de órgãos; Migração do Relatório Listagem de Órgãos; Migração do Relatório da Situação Atual do Órgão. Por se tratar de um sistema que irá gerenciar dados já existentes, optaram pela estratégia de iniciar pela migração de relatórios já existentes no SHS e PROT para que pudessem conferir e atestar que os dados que também estão sendo migrados estão corretos. Até o momento, nenhuma atividade em atraso (Set/2020).

PP - 30280 – Implementação do novo sistema GPES: **1ª Frente: Servidores:** Reunião de planejamento realizada em 25/09 - Objetivo: Tratar a situação atual de um servidor na ficha 0, SHF, ao ser desocupado de um cargo de confiança; Implementar melhorias nos relatórios do CNJ gerando relatórios em formatos ainda não existentes. Entrega da sprint 22 prevista para 09/10 e planejamento da Sprint 23. *Riscos e observações:* Será feito o mapeamento dos relatórios existentes no MUMPS para que sejam migrados para o GPES. Deadline até Dez/2020. No período de 21/08 a 11/09, a equipe atuou exclusivamente nos testes da migração ODP.NET no GPES. O monitoramento diário está sendo realizado. Foram encontrados 4 novos problemas no monitoramento diário, totalizando 5. A análise e correção desses já foram iniciadas. Está sendo analisada a funcionalidade Designação para saber o percentual já concluído. **2ª. Frente: Magistrados:** Sprint 13 reunião de planejamento realizada em 01/10. Objetivo: Inclusão automática do CAAN e implementar a inclusão do cadastro de isenção de IR de Magistrado. Entrega da sprint 13 prevista para 15/10 e planejamento da Sprint 14. *Riscos e Observações:* No período de 10/08 a 11/09, a equipe da FSW atuou exclusivamente nos testes da migração ODP.NET no GPES. O bloqueio total do GPES, SHF, SHFTJ e SHM, no período de 0 as 5h, foi implementado na última sprint. Na reunião de entrega, foi identificado que a HU planejada “Tratar CPF já existente no cadastro de magistrado” apresentava um problema de negócio, e não foi dado o aceite pela representante da DGPEs, porque evidenciaria o acúmulo de cargo, e também porque essa alteração não afeta unicamente a DGPEs, mas JL, Conciliadores, Juiz de paz. Por este motivo, o assunto será levado ao DG da área para se posicionar sobre o assunto. **3ª. Frente: Auxiliares da Justiça:** Sprint 2 reunião de planejamento realizada em 29/09 - Objetivo: Analisar documentação cadastro conciliador; Analisar e adequar protótipo do cadastro do conciliador; Modelagem de dados. Entrega da sprint 2 prevista para 14/10 e planejamento da Sprint 3. *Riscos e observações:* Foi identificado pela equipe que a pré-inscrição e o cadastro do conciliador e juiz de paz são bem similares. Inclusive existe muita similaridade com a mudança de status do cadastro de voluntários. Ficou acordado em reunião que iniciaremos a análise pela indicação do conciliador. Sprint 22 reunião de planejamento realizada em 30/09. Objetivo: Continuar o desenvolvimento do processamento do auxílio locomoção (etapa de pagamento de benefícios) no sistema GPES. Continuar o desenvolvimento do processamento da comprovação do auxílio educação; alterar o processamento do plano de saúde



para não considerar a mudança de faixa no exercício 2020. No período de 10/08 a 28/08, a sprint foi exclusiva para migração ODP.NET no GPES. Foi aberta requisição para alteração em algumas regras do Plano de Saúde para out/20. Está sendo avaliado o esforço / impacto nos andamentos dos processamentos atuais

**4ª.Frente: Benefícios:** Sprint 22 reunião de planejamento realizada em 30/09. Objetivo: Continuar o desenvolvimento do processamento do auxílio locomoção (etapa de pagamento de benefícios) no sistema GPES; continuar o desenvolvimento do processamento da comprovação do auxílio educação; alterar o processamento do plano de saúde para não considerar a mudança de faixa no exercício 2020. Entrega da sprint 22 prevista para 14/10 e planejamento da sprint 23. No período de 10/08 a 28/08, a sprint foi exclusiva para migração ODP.NET no GPES. Foi aberta requisição para alteração em algumas regras do Plano de Saúde para out/20. Está sendo avaliado o Esforço / impacto nos andamentos dos processamentos atuais.

[PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde:](#) Sem alteração do status. Proc. 2018.0233073 - Aprovado em 07/02/2020 pelo CGTIC a deflagração do processo de licitação, valor de R\$ 3.593.552,00. O processo está na DGLOG desde 19/03/2020 para prosseguimento. Última movimentação do processo foi em 04 de agosto de 2020 para o DESAU.

[PP - 30369 – Reformulação do Visualizador do PJERJ:](#) Sem alteração do status (Projeto será liberado no Novo Portal e GabineteWeb). O MaveDoc já se encontra implantado em produção no uso do sistema GabineteWeb, mas, como qualquer outro sistema, sofrendo ajustes, melhorias e adaptações inclusive para adoção no novo portal de serviços. GP informou que considera o projeto encerrado.

[PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil:](#) Sem alteração do status. Comunicação entre os sistemas do TJ (SATI) e da PGM do Rio de Janeiro para recuperação dos DARM's que possuem custas judiciais referentes a processos de execução fiscal. Projeto está parado, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o seu sistema e não temos comunicação com o sistema novo. A DGPCF/DEGAR já foi informada e a DGTEC já pediu o agendamento de uma reunião com a Procuradoria do Município.

[PP - 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADD:](#) Projeto não priorizado no biênio 2019/2020. **PROT e SHS:** Projeto SCOLWEB iniciado em junho/2020 com previsão de substituir esses sistemas até o fim de 2021. Obs. No PROT o SCOLWEB irá substituir apenas a parte de cadastro de órgãos e localizações. A parte de processos administrativos ele está sendo substituído pelo eProt e SEI. **SHM, SHF:** estão sendo substituídos pelo Projeto GPES, que está em andamento com aproximadamente 30% já migrado. **JUI, UNIV:** também estão englobados no projeto GPES, mas encontram-se paralisado. A equipe responsável retomou a migração do sistema Conciliador, que também está no MUMPS, em setembro/2020, tendo 5% concluído. Após, irá desenvolver a migração do JUI e, em seguida, do UNIV.

[PP - 31034 - Migração dos sistemas MUMPS do SEHAC:](#) Sem alteração do status. Aguardando informação dos sistemas judiciais pendentes de migração pelo DESIS.

[PP - 31657 – Custas GRERJ e SMR:](#) Atividades implantadas: sistema Grerj e SRM desenvolvidos e sendo testados. Sistema Portaria de Custas Judiciais Sprint 13 entregue em 21/08/2020. Atividades em atraso: testes integrados com os sistemas judiciais em andamento, Ponto de atenção: encontra-se em desenvolvimento um novo sistema para a Portaria de Custas Judiciais. Em testes e integração com o Pje. Iniciado o levantamento paraintegração com o sistema SEEU. Providências tomadas: desenvolvimento de alteração nos sistemas, incluindo o Pje. Pendências: término dos testes unitário e integrados envolvendo todos os sistemas judiciais. Informações fornecidas em 01/09/2020.



**PP - 31658 - Custas no DCP:** Sem alteração do status. O projeto foi dividido em 3 fases. Início dos testes integrados entre DEATE/DESI em 04/12/2019, referente a 1 fase do projeto ainda sem data final de término. As REQ2015.0002834 (Impressão da certidão de débito) e REQ2017.0069270 (Integração do Sistema de Custas do DCP com o SCJ para visualização da mesma tabela de custas) ainda sendo desenvolvidas pela EDS-Judicial sem data de entrega em produção. Sistema de Custas do DCP com o SCJ para visualização da mesma tabela de custas) ainda sendo desenvolvidas pela EDS-Judicial sem data de entrega em produção. Levantamento já iniciado e será desenvolvido no sistema Arrecadação Integrada Web, que já possui cadastro da certidão de débito.

**PP - 31864 – PIE CR- Petição Eletrônica no TE:** A REQ2016.0113675 foi desenvolvida pela EDS-Judicial e será implementada no projeto do Novo Portal. Liberada a funcionalidade da PIECRE no ambiente de produção e aguarda-se o report do usuário, caso sejam encontrados erros.

**PP - 31923 - Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos Juizados Especiais Cíveis:** Sem alteração no status. Projeto em continuidade. REQ2016.00sei12888 encaminhada para desenvolvimento. Deve ser entregue em conjunto com a REQ2017.0099111 – DCP e PORTAL (CONSPROC - REQ2018.0146297, CONSPROCPRIC - REQ2018.0146312 e TAA - REQ2018.0146318). Sem data prevista para disponibilização em produção.

**PP - 31924 - E- Social (1ª Fase): Objetivo:** viabilizar envio de informações trabalhistas, previdenciárias e sociais ao Governo Federal através do eSocial. **Prazo:** início da obrigatoriedade em Abril/2021. A partir dessa data, haverá divulgação de cronograma detalhado para envio para cada grupo de eventos. Foram solicitados ajustes no protótipo da qualificação cadastral e o levantamento de origem do e-mail institucional do TJRJ. Em 29.09 foi realizada reunião para apresentação do protótipo. Foi identificado que o certificado utilizado pela EMERJ é padrão A3 diferente do certificado utilizado e desenvolvido pelo TJRJ, havendo necessidade de adaptar o E-Social para esse novo padrão. Foi ajustado que o assunto será retomado com o final do projeto OPD.NET.

**PP - 32047 – Gabinete WEB: 1ª. Instância:** O sistema está em produção, tem tido poucos incidentes, sendo a maioria relacionados aos visualizadores de processos e não ao sistema em si. A última versão do Gabinete Web disponibilizada em produção foi em 28/10/20, versão do sistema 2.13.0 com as demandas: INC2020.0056898 Após a assinatura digital da sentença, processos físicos estão indo pro local virtual "Conclusão para Sentença", mesmo após a baixa para o cartório, REQ2020.0004118 Dashboard - Novo card Autos Conclusos há mais de N dias – Magistrado, Novo card Autos Conclusos há mais de N dias – Serventia, Novo card Total de Processos Conclusos – Com/Sem Minuta, REQ2019.0168879 Melhorias tela de Movimentação: Permitir visualizar abas, assim como, alterar localização quando andamento não for conclusão / Consulta Processo: Completar automaticamente o número do processo, REQ2020.0037567 Tela Buscar Processos e Mesa de Trabalho: Melhoria de desempenho na opção Lembrete. **2ª. Instância:** MPS informou que disponibilizou pela primeira em produção 5 requisições (REQ2019.0057188 - Mesa de trabalho do 2º grau, REQ2019.0057179 - Visualização de processos do 2º grau, REQ2019.0057192 - Assinatura e devolução de documentos do 2º grau, REQ2019.0057194 - Sessão de julgamento, REQ2019.0057195 - Dashboards de 2º grau). Está sendo alinhado com o DEATE a advento do sistema para os usuários.

**PP - 32073 - APP dos Advogados/Partes:** Vertigo disponibilizou versão no aplicativo para Android que já foi validada pela DGTEC. Foi solicitada que se inicie a publicação do aplicativo nas lojas.

**PP-32328 – Novo Portal Advogados/Partes:** Todas as atividades foram implantadas em produção e estão disponíveis apenas para o Ministério Público e para Defensoria Pública. **Atividades Entregues:** Consulta Processual (Número, Nome, OAB, CPF/CNPJ, Protocolo, Advogado, Unificada); Painéis



(Intimações/Citações, Outras Comunicações, Audiências, Publicações no DJE); Aviso Eletrônico, Indisponibilidade; Histórico de Petições; Andamento processual ( PUSH); Indisponibilidade; Dashboards; Mensageria; Peticionar Lei 9800/99 (PETLEI9800); Cota Eletrônica, Petição Lei 9800/99; Protocolizar Lei 11.419/2006 (PETELET); Certidão de Crédito para Protesto; Petição Inicial Eletrônica de 2ª Instância (PETINICELET); Visualizar processo ( Entregue a parte da Stefanini, mas ainda existe pendência junto ao visualizador da MAVEN); Alterações JEC ; Alterações JEF; Distribuição Eletrônica Plantão Judiciário; Filtros intimação/citação; Super Sigilo 2ª Instância e Consulta Processual; Validação Grerj; PIE - Conselho da Magistratura; PIE - Turma Recursal; Super Sigilo 1ª Instância; Visualizador MavenDoc. **Atividades Pendentes:** Teste de carga do Novo Portal. A única atividade pendente atualmente é o teste de carga. Está sendo criado o plano de teste conjunto DESIS e DEINF. Os testes serão executados e monitorados pelo DEINF-DIBDA, DEINF-DISER e DESIS-DISIN-SEPOC e EDS. **Aplicativo Escritório Virtual (MPS):** as funcionalidades de 2ª instância foram entregues. As funcionalidades de 1ª instância dependem de adaptação em nos serviços de consulta processual. 5 Serviços devem ser adaptados. Todos estão na Sprint atual da EDS, para levantar os detalhes das adaptações. O cronograma original previa a implantação do novo Portal de Serviços e do aplicativo correlato em dezembro de 2018. Todas as atividades previstas foram entregues e o portal encontra-se em produção, porém com um número restrito de usuários (MP e DP). Apenas o teste de carga ainda não foi realizado, para garantir a disponibilização para todo o público do Tribunal. Porém a atividade está em andamento.

**PP-32330 - Servidor ElasticSearch** – Indexação Jurisprudência e DJE: Atividade realizada pela MPS: Dibda disponibilizou dump para acesso externo. Houver reunião para discussão técnica de indexação para solução do item página 27 do relatório de testes DGCOM. Resta Vertigo efetuar reindexação da base de homologação e liberar base de homologação para a DGCOM.

**PP – 32372 – Super Sigilo:** Atividades implantadas: CONSPROC (REQ2018.0162832-REQ2019.0097752); CONSPROCELET (REQ2018.0162833-REQ2018.0097761); CONSPROCPRIV (REQ2018.0162832-REQ2018.0097755);PETICICELET (PIE) (LEGADO)(REQ2018.00699998);Envio do perfil logado (legado) (REQ2018.0170778-REQ2020.0036319); Envio do perfil logado (Novo Portal) (REQ2020.0075982-REQ2020.0036374); Petição intercorrente (REQ2018.0089717); Alterações no Ejud (todas as funcionalidades disponíveis para o usuário) –REQ2018.0064641). Parte Web, aguardando aprovação da LR. Não há data prevista para entrega. Rafael informa que o Dr. Fábio quer aprovar todas as requisições ainda pendentes, de forma unificada. Assim a requisição pendente com a MPS encontra-se pendente da EDS avançar nas suas requisições.

**PP – 32403 - Novo Sistema de Cobrança:** Entregas até 31/08/2020: Módulo 1 entregue. Iniciado levantamento e desenvolvimento do Módulo 2. Cadastro de funções e de assinantes de documentos entregues. Reuniões constantes com a área usuária (DGPCF/DEGAR). Sprints com duração máxima de 15 dias. Não há atraso. Informação fornecida pelo GP em 01/09/2020.

**PP – 32492 – Automação DASHBOARD:** Sem alteração do status. 1ª etapa: Informações processuais. O Espro encaminhou novamente e-mail com os menus principais e sua fonte de dados para análise pela Vertigo e DESIS em 04/02/2020 e posterior abertura de requisições às novas fábricas para desenvolvimento ou integração das informações. Ainda sem data de continuidade do projeto. A Vertigo efetuou a correção dos erros reportados pelo Espro por e-mail.

**PP-32644 – Portal da Aprendizagem:** Sem alteração do status. Definição de 3 etapas para o projeto. O link foi disponibilizado no portal programas pró-sustentabilidade no dia 05/08/2019. Apresentação



das telas no Liferay. Levantamento dos requisitos (Entendimento sobre o cadastro dos jovens em Acolhimentos e Infratores. Documento de Entendimento aprovado. Reunião com o MCA. A Desembargadora enviou uma requisição para o MP pedindo acesso ao MCA. Reunião com MP no dia 03/10 sobre a construção da API. Aguardando as APIs do MP.

[PP-32762 – Portal do Conhecimento – 2ª Fase:](#) Após reunião com a DGCOM os requisitos foram alinhados. Feita análise de viabilidade da solução técnica para criação de enquete avançada, Wiki, fórum e área de vídeo. Reunião com a cliente para entendimento de requisitos. Análise de viabilidade solução técnica para criação de enquete avançada, Wiki, e uma área de vídeo. Treinamento da ferramenta Wiki. Solução para a utilização do fórum. Finalizada a página de vídeo/teaser. Validado a tela de vídeos. Próximo passo: Desenvolver o Quiz no ambiente de homologação.

[PP-32800 –DevOps:](#) Sem alteração de status. Aguardando reunião com Dr. Fábio Porto ser agendada sobre a 1ª fase (Tutoria, GRERJ e Consulta Unificada) do projeto, com informações dos 2 meses de trabalho e para definição da continuidade do projeto em 2ª fase, pela Vertigo ou internamente (A EDS-Logística está com projeto Azure DevOps em andamento).

[PP- 32822 – App do GabineteWeb:](#) A Vertigo disponibilizou na Play Store a versão em homologação do app no dia 07/05/2020. Estão fazendo os últimos acertos com as equipes da EDS e da infra para distribuir o aplicativo para os usuários de Android e Apple. Informamos que a tela de login sofreu algum impacto por conta das alterações feitas pela EDS, estamos aguardando a EDS para dar prosseguimento. Aguardando validação da versão do app em Android apontando para Produção.

[PP - 32891 – Novo Sistema EMERJ:](#) Projeto em fase de finalização.

[PP- 32892 – Automação das Portaria de Custas:](#) Projeto em fase de execução. Em andamento o levantamento das novas regras de negócio que serão definidas pelo TJ com o Claudio Blanco- Desis e Jobson Nascimento – CGJ com relação à criação do RTF. Aplicação da identidade visual concluído. A Portaria de Custas Extrajudiciais já possui um sistema.

[PP-32893 – Migração DATAVIX – VISADOC:](#) O primeiro módulo do VISADOC foi disponibilizado em produção no dia 14/04/2020 e o último foi disponibilizado em 03/06/2020. Já se encontra em pleno usuários pelas áreas de negócio. Projeto finalizado.

## 5. Situação atual dos projetos do DEATE

[PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial:](#) Projeto finalizado. Implantação em julho de 2020. Quanto às Competências Infância e Juventude e Dívida Ativa foram retiradas do escopo inicial pois serão implantadas no projeto de Implantação do PJE.

[PP - 31839- Fluxo dos Juizados Fazendários:](#) Projeto finalizado em julho de 2020.

[PE - 31880 - Atualização do Parque Tecnológico:](#) Instalação do segundo monitor para compor serventias criminais. Substituição de computadores e scanner (andamento prejudicado pela pandemia). Instalação de webcam para suprir necessidades de reuniões e audiências virtuais. Instalação de notebook para uso das partes nas audiências criminais (andamento prejudicado pela pandemia). Projeto está paralisado devido a pandemia do coronavírus que assolou o estado, com suspensão de prazos e trabalho Home Office. Aguardando retorno à normalidade para continuidade do projeto.



[PP- 32163 – Plantão Judicial Eletrônico](#): Implantação. Testes integrados Infância / Juventude com a polícia ainda sem previsão de término. Foi solicitado pelo DEATE e entregue: Desenvolvimento de vários vídeos demonstrativos das funcionalidades. Aguardando estabilização do projeto para encerramento do projeto.

[PP – 32323 – Fluxo JEC – 2ª Fase](#): Projeto encerrado em maio/20.

[PP - 32404 -Sistema GRP-THEMA da DGPCF](#): Com relação ao último status do projeto, ainda estão sendo analisados alguns dados das views que fazem parte da primeira etapa das integrações. Todas as views já foram disponibilizadas pela DGTEC em homologação para a THEMA, tivemos um grande avanço com relação a integração para a criação dos logins através do GPES para o GRP, integração para a criação dos órgãos no GRP. Algumas validações ainda estão pendentes com os usuários da DGPCF. No momento o projeto está com atraso, pois devido a quarentena, a DGPCF preferiu não realizar as validações dos dados que já foram disponibilizados através das views das integrações, com relação ao módulo de custos, será retomado no mês de setembro de 2020. A empresa enviou um novo cronograma para a retomada dos trabalhos e ainda está sendo avaliado (DGPCF/DGTEC). Com relação ao SIPLAG não tivemos mais nenhum retorno do executivo e nem da DGPCF. Foi solicitado uma atualização de dados para o SIAFE-RIO, mas também sem retorno, apesar de várias tentativas. Devido a pandemia, houve atrasos conforme informado acima e em contato com o Gerente de Projetos da THEMA, ele informou que pelo novo cronograma proposto encaminhado em 29/07/2020, a data final da implantação foi sugerida para o dia 31/07/2021. O cronograma foi enviado pela empresa na data informada acima, porém ainda sem retorno da aprovação por parte da DGPCF

[PE - 32405 - Implantação do Novo Sistema de Processo Administrativo Eletrônico – SEI](#): O sistema está liberado para todas as Diretorias. Ato Normativo n. 19/2020, publicado em 07/07/2020, instituindo o SEI como meio oficial e obrigatório de informações, documentos e processos administrativos eletrônicos no âmbito do TJRJ. Projeto encerrado em Julho/20.

## 6. Situação atual dos projetos do ASGOV

[PE- 32407 - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos](#): Foi iniciado um piloto com a equipe do financeiro, com previsão de término em julho ou início de agosto de 2020. Neste caso, a abordagem é a segurança na comunicação entre serviços e que no planejamento inicial ficaria para o final do cronograma. A equipe da EDS-Logística está desenvolvendo o projeto e dentro do prazo previsto, mas com alguns problemas relacionados ao balanceamento da aplicação. Resolvida esta questão a integração ocorrerá sem problemas.

## 7.Situação atual dos projetos do DEINF

[PE – 32408 - Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC](#): Sem alteração do status. Atualmente o projeto está com atraso do cronograma. Não houve foco para algumas atividades devido ao envolvimento da diretoria em processos de contratação: como Switch Core, Switch de



Datacenter, Switches de Acesso, Manutenção e Suporte do Appliance Web Gateway e Aquisição de Solução de Prevenção a Intrusão (IPS). Também houve foco na preparação da infraestrutura para implantação do PJe em Maricá, que mudou de rumo apenas na última hora para a infraestrutura do CNJ, em nuvem. Foi encaminhada tarefa para ser realizada em conjunto com o DESIS de avaliação das cargas de trabalho (workload), em prosseguimento aos estudos, para que se possa de forma justificada traçar os cenários aplicáveis a cada workload.

## 8.Situação atual dos projetos do DEINT

[PE – 32402 - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE:](#) até 08/09/20 foram implantados 61 Juizados Cíveis, Adjuntos Cíveis. Cronograma. O cronograma está sendo seguido,

[PP – 32406 - Migração do Projudi para o sistema SEEU:](#) Houve a migração de 99.933 processos até 30/05/2020. Realizada uma nova extração e atualização na base de dados em maio, concluindo então a migração destes processos para o SEEU, conforme despacho em processo SEI 20190620986. Projeto em fase de encerramento.
